


Procesplan for kommunal fællesprojekt

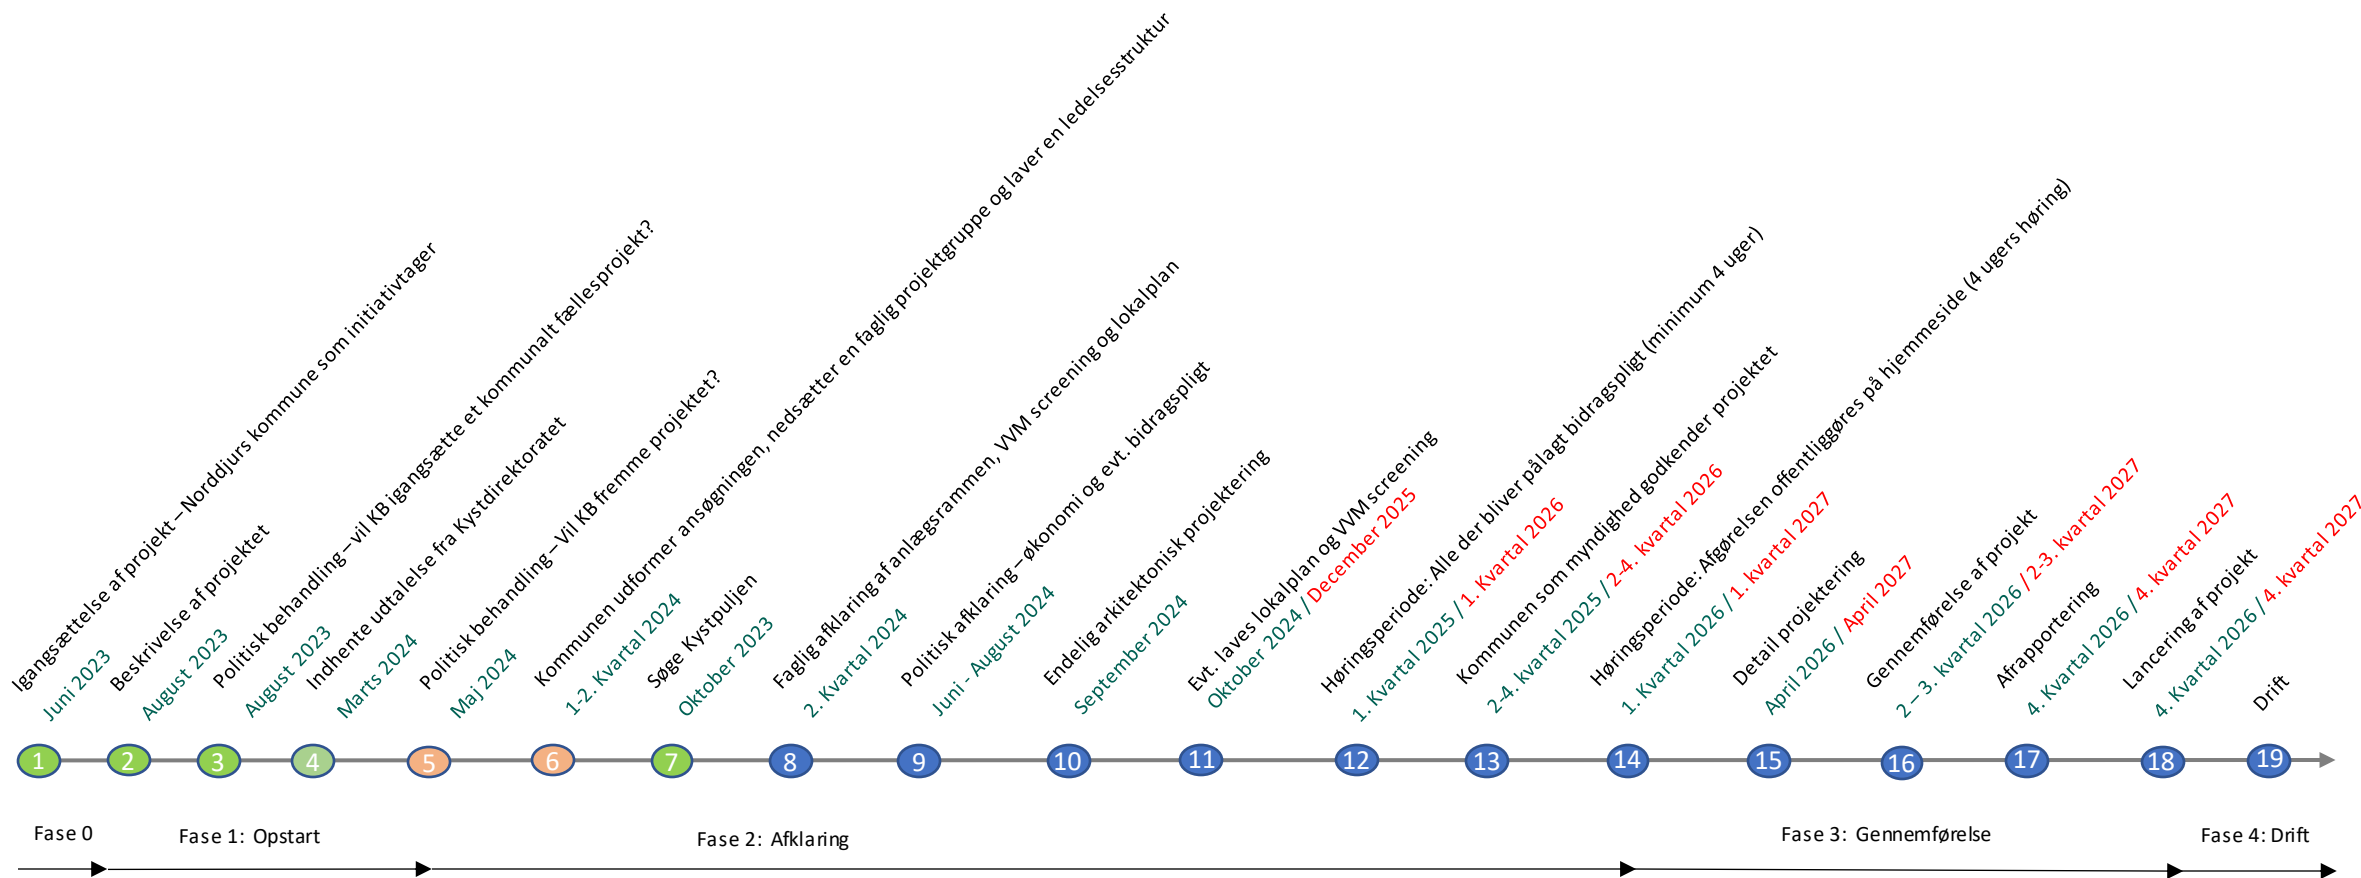

Læseguide:

- Farvekode

- Grøn betyder at det er klaret og veloverstået

- Orange betyder at det er igangsat men ikke afsluttet

- Blå betyder at det endnu ikke er igangsat

- Der skal tages forbehold for at det er en foreløbig tidslinje, hvilken kan blive ændret i takt med at projektet udvikler sig; høringer, politisk behandling, foning osv.
- Ved godkendelse af fondsmidler fra kystpuljen, accepteres en deadline på 5 år fra tilsagn af fondsmidler fra dec 2023 → dec 2028.

1. Igangsættelse af projekt

- Juni 2023
- Igangsættelse af projektet – Norddjurs kommune som initiativtager
 - Dette skete i første omgang via strategien Næse for Vand.
 - Næste skridt var et identificere en del af Næse for Vand strategien som kunne bruges til dette konkrete projekt.
 - Projektet blev identificeret til Kystcampen Juni 2023.

2. Beskrivelse af projektet

- August 2023
- Beskrivelse af projektet blev lavet i sammenhæng med et ekstraordinært MTU møde i august.
- Projektbeskrivelsen indeholdte baggrunden for projektet, de tekniske aspekter og tankerne bag finansieringen.

3. Politisk behandling

- August 2023
- Politisk behandling – på et ekstraordinært møde i august og september skulle først MTU og dernæst KB tage stilling til om de vil igangsætte et kommunalt fællesprojekt?
- Dette var essentielt for at søge midler via kystpuljen.
- Igangsættelsen af det kommunale fællesprojekt blev godkendt af både MTU og KB.

4. Indhente udtalelse fra kystdirektoratet

- Marts 2024 – 05.03.24 (4 ugers sagsbehandling + 10 dage ekstra pga påske) - Modtagelse af udtalelse d. 15.04.24.
- Norddjurs kommune indhentede en §2 udtalelse fra Kystdirektoratet som led af det kommunale fællesprojekt.
- §2 udtalelsen indeholder en vurdering af behovet for/virkningen af kystbeskyttelse, vurdering af beskyttelsesanlæggene, den videre process osv.

5. Politisk behandling

- Maj 2024
- Politisk behandling – På baggrund af finansieringen fra kystpuljen, §2 udtalelsen fra Kystdirektoratet og projektet indtil nu, skal MTU og KB tage en beslutning om, de vil godkende den videre proces, eller rettere sagt, om de vil fremme projektet.

6. Ansøgning

- 3. kvartal 2023 og 1-2. kvartal 2024
- Kommunen udformer ansøgningen til kystpuljen og derved også til kommunen, nedsætter en faglig projektgruppe og laver en ledelsesstruktur.
- Ansøgningen til kystpuljen blev lavet i 3. kvartal 2023. Der arbejdes videre på ansøgningen - da den skal bruges som projektbeskrivelse for hele projektet.

7. Søge kystpuljen

- Oktober 2023 – fik tilsagn december 2023
- Norddjurs kommune søgte kystpuljen i oktober 2023 og fik tilsagn til 12,2 mio. kr. i december 2023.
- Midlerne skal bruges indenfor en periode på 5 år sammen med de resterende midler, som skal findes et andet sted.

8. Faglig afklaring

- 1-2. Kvartal 2024
- Faglig afklaring af anlægsrammen, VVM screening og lokalplan
- Første arbejds møde med arbejdsgruppen fandt sted i 1. kvartal 2024 hvor den indledende runde i forhold til fagområderne fandt sted.
- En mere dybdegående faglig afklaring finder sted i 2. kvartal 2024

9. Politisk afklaring

- 2-3. kvartal 2024
- Politisk afklaring – økonomi og evt. Bidragspligt
- I 2 og 3. kvartal 2024 skal en finansieringsstrategi laves og godkendes af politikerne.

10. Arkitektonisk projektering

- September 2024
- Endelig arkitektonisk projektering

11. Laves lokalplan og VVM screening

- Oktober 2024 / December 2025
- Evt. laves lokalplan og VVM screening.
- En arbejdsgruppe med interne fagfolk er taget med i processen fra start (1. Kvartal 2024)

12. Høringsperiode

- 1. Kvartal 2025 / 1. Kvartal 2026
- Høringsperiode: Alle der bliver pålagt bidragspligt (minimum 4 ugers høringsfrist) får mulighed for at komme med et høringssvar.

13. Godkendelse af projektet

- 2-4. kvartal 2025 / 2-4. kvartal 2026
- Kommunen som myndighed godkender projektet (det er Kim T fra Vej og Ejendom, som er myndighed)

14. Høringsperiode

- 1. Kvartal 2026 / 1. kvartal 2027
- Høringsperiode: Afgørelsen offentliggøres på hjemmeside (mindst 4 ugers høring)
- Borgerne får mulighed for at komme med et høringssvar på kommunens afgørelse)

15. Detail projektering

- April 2026 / April 2027
- Detail projektering:
 - Finder priser, leverandører, byggeleder osv.

16. Gennemførelse af projekt

- 2 – 3. kvartal 2026 / 2 - 3. kvartal 2027
- Gennemførelse af projektet.
- Denne del er den fysiske gennemførelse af projektet:
 - Etablering af højvandslukket
 - Hævning af veje
 - Støbe mure
 - Etablering af diger

17. Afrapportering

- 4. Kvartal 2026 / 4. kvartal 2027
- Afrapportering: En gennemgang er projektet og dets faser. Samt det endelige resultat.

18. Lancering af projekt

- 4. Kvartal 2026 / 4. kvartal 2027
- Lancering af projektet, dette kan evt. ske via et borgerevent på havnen eller lignende.

19. Drift

- Her skal det defineres hvordan og hvorledes driften skal foregå.
- Skal der være et digelag?
- Skal kommunen stå for al driften?
