Understøttelse af Skovskolens udvidelse i Norddjurs2023

November 2023

Status og procesplan med aktivitetsspor jvf. kommissorium

2023 | 2024 | 2025 | 2026

Funding

Adm. og undervisningsbygning

Opstart af kollegiebyggeri

Byggeri

Se byggeriets faser slide 3

Spor 1
Understøtte udvidelsen

- Økonomisk bevilling til anlæg på 8 mio. (5,5 mio. i rest)
- Interessetilkendegivelser fra samarbejdspartnere til brug for fondsansøgninger
- Myndighedsbehandling af byggeriets faser
- Ansøgning til EU om projekt. Polices to promote the competitiveness of forest-based SMEs
- Samarbejde om fuglereservat Ørsted plantage (Hedeselskabet, Fugleværnsforeningen, KU, NDK)

Spor 2
Innovations-partnerskab

- Forslag om erhvervssamarbejde med Dania om etablering af et incubationsmiljø - Uafklaret

Spor 3
Skole- kultur- bosætning- lokal forankring

- Samarbejde med Auningskole og UU
- Information om muligheder for offentligtransport/flexture til og fra Skovskolen
- DM i Vildt
- ”De gode historier” (September 2023)
- Studiejobs på Det Grønne Museum

Status og aktivitets- og procesplan for byggeriets faser

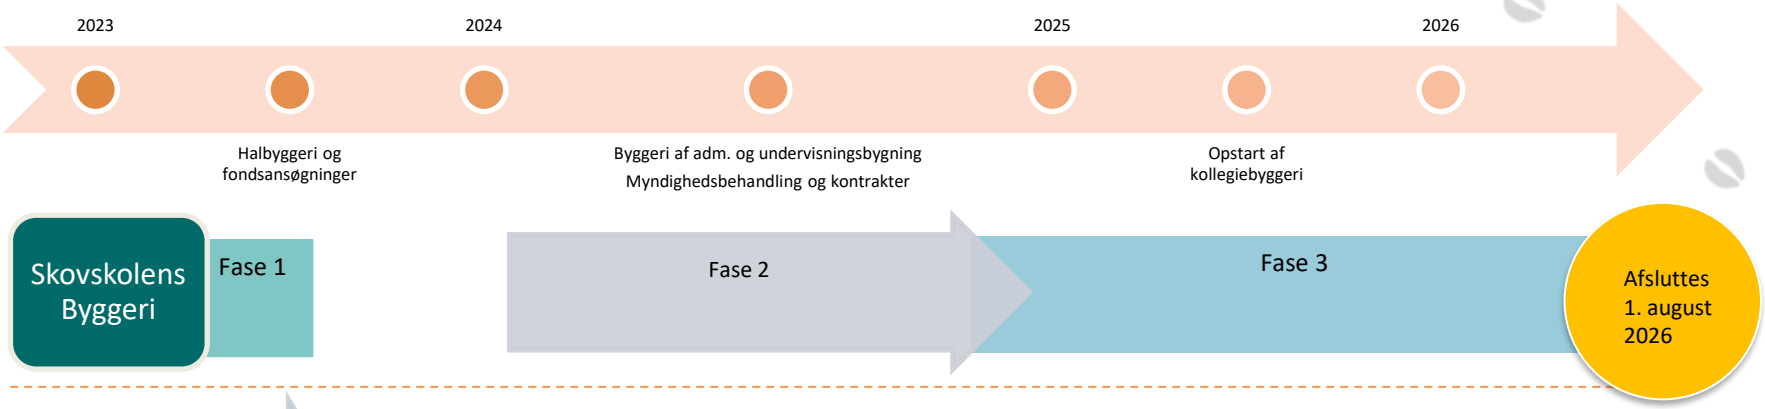

Fase 1

Analyser og undervisnings-hal

- Afsluttet

Fase 2

Adm. og undervisnings - byggeri

- Licitation
- Feb. 2024 – opstart af byggeri
- Dec. 2024 – ibrugtagning af bygning

Fase 3

Kollegie-byggeri

- Fondsansøgninger pågår
- Primo 2024 - Indledende dialog med fagforvaltning om myndighedsbehandling
- 1. Feb 2024 - Opstart af Forsøgsprojekt med fokus på biogene byggematerialer
- 1. Maj 2024 - Byggeansøgning indsendes til NDK
- 15. Juli 2024 - Opstart af kollegiebyggeri
- 1. Aug. 2026 - Ibrugtagning af kollegie og indvielse af et samlet campusområde
- 2025/2026 - Kollegiedrift overgår til Løvenholmfonden
