UDBUDSTIDSPLAN

Dato: 12. april 2023
Rev. : .....

Norddjurs Kommune
Glesborg Skole - tilbygning

ID	Task Name	Duration
1	Udbud og beregningsperiode	16 days
2	Licitation	1 day
3	Evaluering og forhandling	7 days
4	Politisk behandling	10 days
5	Kontrahering med fagentreprenører	6 days
6	Mobilisering	28 days
7	Byggestart	2 days
8	Byggepladsarbejder	4 days
9	Jordarbejder og ledninger I jord	9 days
10	Fundamenter og terrændæk samt installationer I terrændæk	15 days
11	Porebetonvægge og teglstensmure samt installationer I vægge	25 days
12	Tagkonstruktion og ventilationsarbejder	25 days
13	Isætning vinduer og døre	10 days
14	Varme på bygningen (mellemtermin dagbodbehæftet)	1 day
15	Etablering af åbning mod eksisterende bygning	5 days
16	Behandling vægoverflader	10 days
17	Montering lofter og installationer I lofter	14 days
18	Gulvarbejder	10 days
19	Montering indvendige døre	5 days
20	Slutbehandling vægoverflader samt malerbehandling træværk	16 days
21	Montering fast inventar	4 days
22	Monteringsarbejder el, vvs og ventilation	15 days
23	Udvendige belægninger og terrænarbejder	20 days
24	Førgennemgang fagentrepriser	1 day
25	Mangelgennemgang	1 day
26	Mangelafhjælpning	10 days
27	Afleveringsforretning og overdragelse til bygherre (sluttermin dagbodbehæftet)	1 day
28	Ibrugtagning af byggeriet	5 days

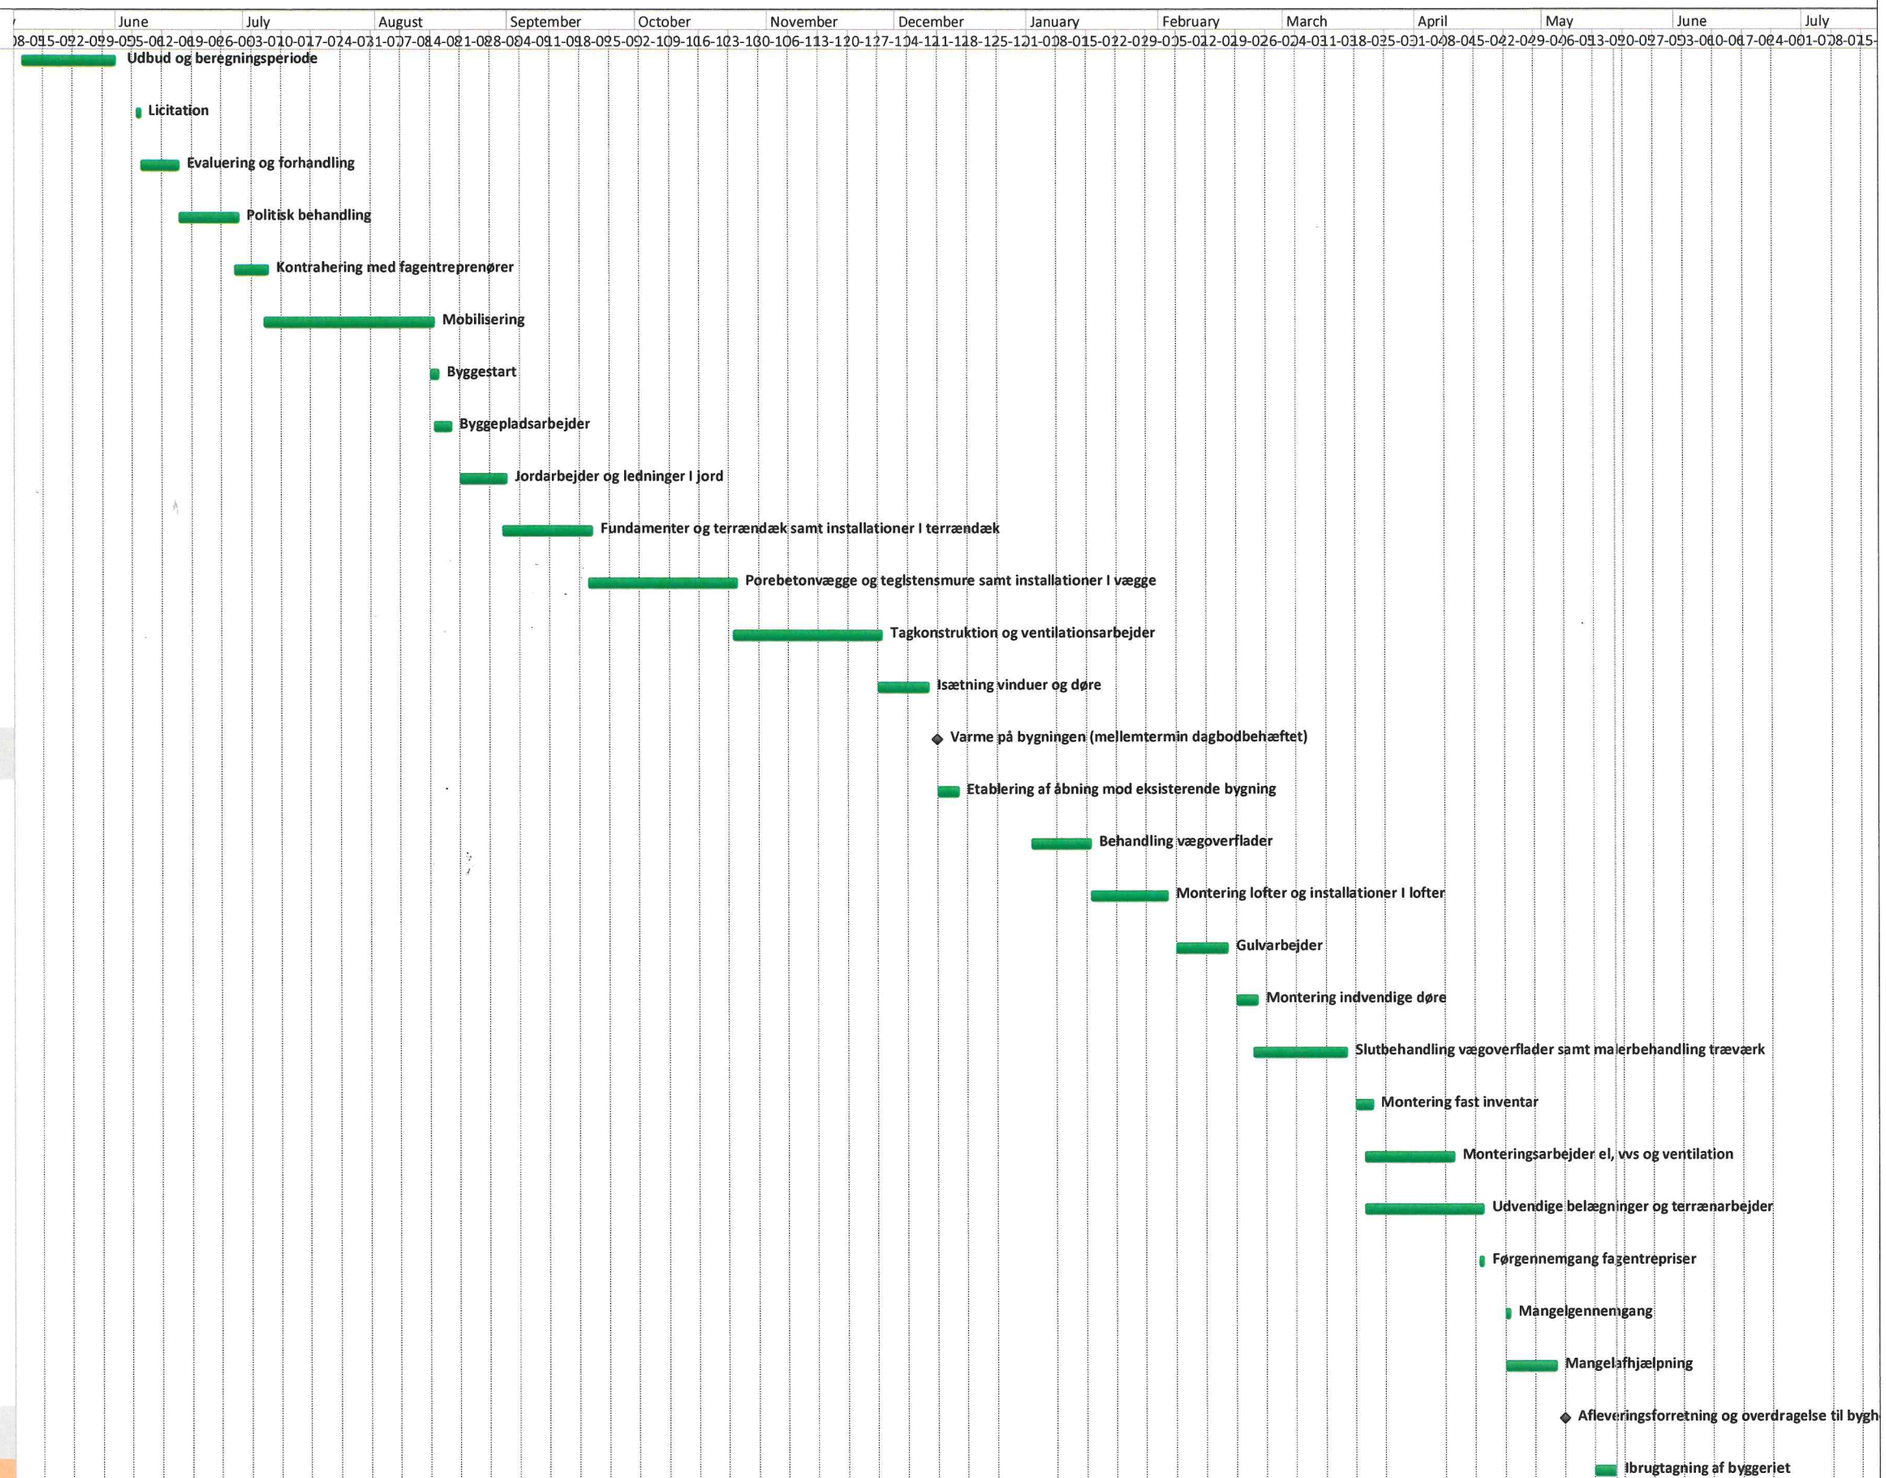

FRUERLUND & HØG
TEGNESTUENAPS TINGPARKEN 83 ØRSTED
